

b]j3f6 ufpFkflnsf

ufp++ sfo{kflnsfsf] sfof{no

b]j3f6, tgx'+F

u08sL k|b]z, g]kfn

k"jf{wf/ ljsf; tyf ejg lgodg zfvf



ldlt M @)&%÷!@÷*

k |:t'tstf{ M tLy{/fh 9'Ēfgf

O{IGhlgo/ Pj+ zfvf k|d'v

१. शाखा/ईकाइको नाम : पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा

२. शाखा/ईकाइ वा अन्तर्गत कार्यरत जनशक्ति संख्या : ७ जना

३. चौमासिक लक्ष्य :

- प्रथम चौमासिक अवधिमा रहेका योजना मध्ये सम्पन्नता हुन बाँकी रहेका छुटपुट योजना सम्पन्नताको लागि ताकेता गर्ने ।
- प्रथम चौमासिक अवधिमा सञ्चालन भै सम्पन्न हुन बाँकी योजनाहरु सम्पन्न गर्नको लागि ताकेता गर्ने ।
- दोश्रो चौमासिक अवधिमा भएका योजनाहरुको फिल्ड सर्भेक्षण गरि लागत अनुमान तयार गर्ने, सम्पन्नताको लागि ताकेता गर्ने, फिल्ड निरीक्षण तथा अनुगमन गरि छिटो कार्य सम्पन्न गर्न ताकेता गर्ने ।
- सम्पन्न भएका योजनाहरुको मूल्यांकन गरि भुक्तानीको लागि पेश गर्ने ।
- तेश्रो चौमासिकमा रहेका योजनाहरुको समेत क्रमशः लागत अनुमान तयार गरि सम्पन्नता गराई कार्य शुरु गराउने ।
- भवन नियमन तर्फ : कुनै पनि घर तथा संरचना नयां निर्माण गर्दा नक्शापास गरेर मात्र शुरु गर्नको लागि प्रचार प्रसार तथा जानकारी गराउने । निर्माण भैसकेका घर तथा संरचनाहरुको अभिलेखिकरण राख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने ।

४. सम्पादन गरिएका कार्यहरु : (फोटो, तथ्यांक सहित)

गाउँपालिका स्तरिय योजनाहरु :

१. शालिग्राम कोरिडोर

(दासढुंगा पुलबाट देवघाट कोटा छरछरे भरना बन्चरे पहरा हुँदै खाल्टे)

देवघाट गाउँपालिकाको ५ वडामध्ये ४ वडा (५,४,१,२) हुँदै जाने महत्वपूर्ण सडक

जम्मा लम्बाई : ३६ कि.मी.

दासढुंगा पुल देखि देवघाट सम्म : ६ कि.मी., ग्राभेल सडक, मर्मत सम्भार गरिएको, थप स्तरोन्नति कार्य हुँदैछ ।

देवघाट देखि कोटा सम्म : १४ कि.मी., कच्चि सडक, वर्षातपछि मर्मत सम्भार गरिएको, हाल ग्यावियन जाली र स्तरोन्नति कार्य हुँदै, नियमित रुपमा गाडी सञ्चालन भैरहेको ।

कोटा देखि छरछरे भरना हुँदै तोरिवारी सम्म : ७ कि.मी. गतसालमा नै ट्रयाक खुलेको, वर्षात पश्चात मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गरिएको ।

तोरिवारी देखि बन्चरे पहरा तर्फ : हालसम्म विसाउने ढुंगासम्म करिब १ कि.मी. नयां ट्रयाक निर्माण भएको, अगाडि बढ्दै जाने क्रममा भएको ।

विसाउने ढुंगा देखि अगाडि बन्चरे पहरा सम्म करिब १५०० मिटर मात्र ट्रयाक जोड्न बाँकी रहेको ।

सांसद कार्यक्रमको बजेटबाट र प्रदेश तर्फको बजेटबाट ट्रयाक जोड्न बाँकी खण्ड यसै आ.व. मा जोड्ने लक्ष्य लिइएको ।

बन्चरे पहरादेखि खाल्टे सम्म : करिब ६ कि.मी. को सडक खण्डमा सामान्य मर्मत सम्भार गरि यातायात सञ्चालनमा हुनसक्ने बनाईएको, थप स्तरोन्नति कार्य गर्नुपर्ने छ ।

२. गाईघाट सिंच्याड काफलडांडा कर्ताप छिपछिपेभञ्ज्याड
सानुभञ्ज्याड मार्ग

देवघाट गाउँपालिकाको ५ वडामध्ये ४ वडा (४,१,३,२) हुदै जाने महत्वपूर्ण सडक

जम्मा लम्बाई ३२ कि.मी.

गाईघाट देखि छिपछिपेभञ्ज्याङ सम्म : २२ कि.मी., गत साल ट्रयाक पुरा भएको कच्चि सडक, वर्षातपछि मर्मत सम्भार गरि यातायात सञ्चालन भै रहेको ।

छिपछिपेभञ्ज्याङ देखि सानुभञ्ज्याङ सम्म : १० कि.मी., कच्चि सडक, वर्षातपछि मर्मत सम्भार गरि यातायात सञ्चालन भै रहेको ।

३. मास्दी सानुभञ्ज्याङ खाल्टे मार्ग

मास्दीघाट सेती नदि किनार बुद्धसिं मार्ग देखि देवघाट गाउँपालिका वडा नं. २ र रिसिङ गाउँपालिकाको सिमाना हुँदै खाल्टे कालीगण्डकी नदि किनार शालिग्राम कोरिडोर जोड्ने महत्वपूर्ण सडक

जम्मा लम्बाई १४ कि.मी.

मास्दीघाट देखि सानुभञ्ज्याङ सम्म : ७ कि.मी., कच्ची सडक, वर्षातपछि मर्मत सम्भार गरि यातायात सञ्चालन भै रहेको ।

सानुभञ्ज्याङ देखि खाल्टे सम्म : १० कि.मी., कच्ची सडक, वर्षातपछि मर्मत सम्भार गरि यातायात सञ्चालन भै रहेको ।

४. डाल्दीघाट लुङरिङ छिपछिपेभञ्ज्याङ सुन्तला मार्ग

डाल्दीघाट सेती नदि किनार बुद्धसिं मार्ग देखि देवघाट गा.पा. वडा नं. ३ को वडा कार्यालय लुङरिङ हुँदै छिपछिपेभञ्ज्याङ जोड्ने महत्वपूर्ण सडक

जम्मा लम्बाई १६ कि.मी.

डाल्दीघाट देखि लुङरिङ सम्म : १२ कि.मी., कच्चि सडक, वर्षातपछि मर्मत सम्भार गरि यातायात सञ्चालन भै रहेको ।

लुङरिङ देखि छिपछिपेभञ्ज्याङ सम्म : ४ कि.मी., कच्चि सडक, वर्षातपछि मर्मत सम्भार गरि यातायात सञ्चालन भै रहेको ।

५. छिपछिपेभञ्ज्याङ व्यागन जरम खाल्टे मार्ग

छिपछिपेभञ्ज्याङ देखि देवघाट गा.पा. वडा नं. २ को वडा कार्यालय व्यागन, जरम हुँदै खाल्टे शालिग्राम कोरिडोर जोड्ने महत्वपूर्ण सडक

जम्मा लम्बाई १० कि.मी.

छिपछिपेभञ्ज्याङ देखि व्यागन सम्म : ४ कि.मी., कच्चि सडक, वर्षातपछि मर्मत सम्भार गरि यातायात सञ्चालन भै रहेको ।

व्यागन देखि जरम हुँदै खाल्टे सम्म : ६ कि.मी., कच्चि सडक, वर्षातपछि मर्मत सम्भार गरि यातायात सञ्चालन भै रहेको । बाटो उकालो तथा अष्टेरो घुम्ती मोड भएकोले थप स्तरोन्नति गर्नुपर्ने ।

६. कर्ताप फोस्रेपानी देवघाट मार्ग

देवघाट गा.पा. वडा नं. ४ को कर्ताप (गाईघाट सिंच्याङ छिपछिपेभञ्ज्याङ मार्ग) देखि देवघाट आउने छोटो बाटोको रूपमा रहेको महत्वपूर्ण सडक

जम्मा लम्बाई १० कि.मी.

सडकको डि.पि.आर. तयार भएको, यस आ.व. मा रु. ३० लाख बजेट
विनियोजन भएको । बाटो खन्त काम माथिबाट गर्ने कि तलबाट गर्ने भन्ने
विवादका कारण हालसम्म निर्माण कार्य शुरु नभएको ।

वडा न. १

गाउँसभाबाट स्वीकृत योजनाहरू :

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट रु. (हजारमा)	योजनाको स्थिति	कैफियत
१	पार्वती मा.वि. कम्पाउण्ड निर्माण	४००	सम्पन्न	
२	कालिकाटार शहिद चोक देखि कालिगण्डकी झो.पु. मोटर मार्ग (झो.पु. स्ल्याप समेत) मर्मत	२००	कम सम्पन्न, भुक्तानी हुन बाँकी	
३	वडा कार्यालय देखि जामुने सम्म जोड्ने मोटर मार्ग नयाँ ट्रयाक	१०००	साईट अवलोकन भएको, दुई गाउँबीच विवाद भएकोले वडा मार्फत छलफल हुँदैछ।	
४	कर्ण मोटर मार्ग मर्मत ग्राभेल (ह्युम पाइप र जाली समेत)	३००	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, कार्य हुँदै	
५	गोपीटार मोटर मार्ग मर्मत (ह्युम	२००	सम्पन्न	

	पाइप र जाली समेत)			
६	बेलडाँडा देखि बसेनीटार खहरे खोला मोटर मार्ग मर्मत (ह्युम पाइप र जाली समेत)	२००	सम्पन्न	
७	वर्षाखोला मोटर मार्ग मर्मत (ह्युप पाइप र जाली समेत)	१५०	सम्पन्न	
८	शालीग्राम कोरिडोर मार्ग देखि आँपटार काली नदी जाने मोटर मार्ग नयाँ ट्रयाक निर्माण	२००	काम सम्पन्न, भुक्तानी हुन बाँकी	
९	कालीगण्डकी निकम्पाउण्ड .वि.मा. निर्माण	२५०	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, कार्य हुँदै	
१०	कोटा रङ्गशाला	१०००	कुन माध्यमबाट के काम गर्ने भनी टुङ्गो नलागेको ।	
११	बिमराश्वारा सामुदायिक भवन निर्माण	१००	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, कार्य हुँदै	

zflnu | fd sf]l/8f]/ dfu{ lgdf{0f x'+b}







5/5/] em/gf kfs{ lgdf{0f






फोटोहरू :

पार्वती मा.वि., कोटा कम्पाउण्ड निर्माण



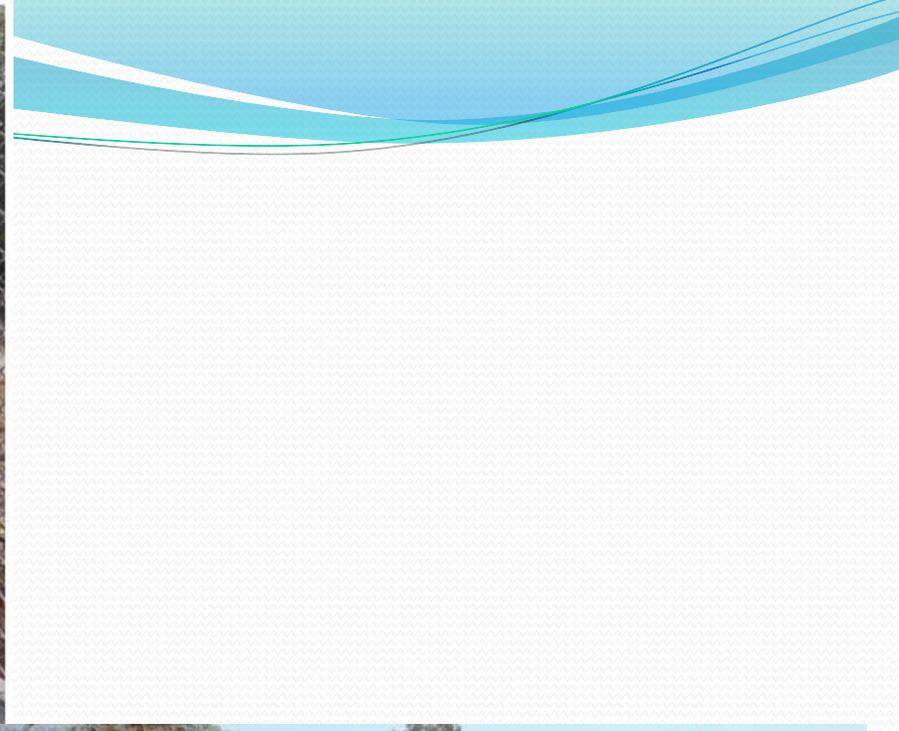



वर्षाखोला मोटर मार्ग













बेलडांडा बसेनी खहरे मोटर मार्ग









कालो सुंगुर संरक्षरको लागि खोर निर्माण





कालिकाटार भो.पु. मा मो.सा. जाने बाटो निर्माण



पाखाटोल मोटर मार्ग















कालिगण्डकी नदि जाने बाटो :





वडा नं. २

गाउँसभाबाट स्वीकृत योजनाहरू :

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट रु (हजारमा)	योजनाको स्थिति	कैफियत
१	कुसुन्डे ग्रामिण कृषि मोटर मार्ग	१०००	सम्पन्न	
२	कछार क्षेत्र कृषि मार्ग छिपछिपे द्वारगौडा	५००	ल.ई. भएको, सम्झौता नभएको	
३	व्यागन कुवादी मोटर मार्ग	१०००	सम्पन्न	
४	आमडाँडा मास्दी खानीभित्ता मोटर मार्ग	९००	सम्पन्न	
५	जैथुम डिहीडाँडा मोटर मार्ग	५००	कार्य सम्पन्न, भुक्तानी हुन बाँकी ।	
६	खाल्टे मोटर मार्ग ग्राभेल	२५०	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, काम हुँदै	
७	काफले चौतारा डिही घोरेटो बाटो निर्माण	५०		योजना परिवर्तन

८	दरैटार तार जाली खरिद	२००	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, काम हुँदै	
९	खाल्टे रंगशाला निर्माण	५००	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, काम हुँदै	
१०	जरम क्लब भवन निर्माण	१००	कार्य सम्पन्न, भुक्तानी हुन बाँकी ।	

अन्य योजनाहरू :

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट (ल.ई) रु हजारमा	योजनाको स्थिति	कैफियत
१	तालवारी कृषि भवन मर्मत	५००	कार्य सम्पन्न, भुक्तानी हुन बाँकी ।	
२	कोटवैदी कृषि अनुसन्धान केन्द्र जाने बाटो निर्माण	५०	सम्पन्न	
३	तालवारी कृषि भवन जाने बाटो निर्माण	३०	सम्पन्न	
४	आमडांडा बैठक भवन	६०	ल.ई. भएको	
५	सर्वोदय आ.वि. परिसर व्यागनमा पूर्ण सरसफाईको लागि खा.पा. तथा अन्य	३००	ल.ई. भएको, काम भैसकेको	

	पूर्वाधार			
६	घ्यासिवास खा.पा. आयोजना	२००	ल.ई. भएको	
७	खाल्टे पार्क निर्माण	२५०	सम्पन्न	
८	दरौखोला, छेरेंगाखोला र चिण्डेखोला घाट जाने बाटो ।	१२०	सम्पन्न	
९	खाल्टे बन्चरे बाटो मर्मत तथा सफाई	३००	सम्पन्न	
१०	खाल्टे मगरे बाटो मर्मत	७०	ल.ई. भएको	
११	खाल्टे खा.पा.यो. (ए र बी)	२००	ल.ई. भएको	
१२	खाल्टे सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ भवन मर्मत	६०	सम्पन्न	
१३	खाल्टे प्रहरी चौकी भवन मर्मत	६०	सम्पन्न	
१४	खाल्टे मास्दी मोटर मार्ग मर्मत तथा सफाई	५२५	सम्पन्न	
१५	खाल्टे जरम व्यागन छिपछिपे मोटर मार्ग मर्मत तथा सफाई	३४०	सम्पन्न	
१६	क्रांतीप मोटर मार्ग मर्मत तथा सफाई	१५०	सम्पन्न	
१७	छेरेंगा जैठुम मोटर मार्ग मर्मत तथा सफाई	१४०	सम्पन्न	
१८	मास्दी सिंचाई आयोजना	१६०	ल.ई. भएको	कृषि
१९	कोसिडा खा.पा.यो., सिम्लेक	४००	ल.ई. भएको	
२०	सानुभञ्ज्याङ लिफ्टिङ खा.पा.यो.	२०००	ल.ई. भएको	

२१	सिम्लेक लिफ्टिङ खा.पा.यो.	१८००	ल.ई. भएको	
२२	मुकुरलोक खा.पा.यो., खानीभित्ता	१००	सम्पन्न	
२३	चांप सिंचाई सानुभञ्ज्याङ	८०	ल.ई. भएको	
२४	विरौटा खा.पा.यो.	६०	सम्पन्न	
२५	कालिगंगा मा.वि. खा.पा., शौचालय, हात धुने ठाउँ बनाउने काम ।	९०	ल.ई. भएको	
२६	आदर्श मा.वि. खा.पा., शौचालय, हात धुने ठाउँ बनाउने काम ।	८७	ल.ई. भएको	
२७	बैदी सार्वजनिक शौचालय बनाउने काम ।	२००	ल.ई. भएको	
२८	५ ठाउँमा आरन पूर्वाधार निर्माण ।	५००	ल.ई. भएको	
२९	घन्टाचुलीमा सिंङी तथा रंगरोगन ।	१५०	ल.ई. भएको	
३०	कमलादेवी मन्दिर सिंङी निर्माण ।	३००	ल.ई. भएको	
३१	हुलाक भवन सिम्लेक मर्मत	२००	ल.ई. भएको	
३२	खाल्टे पार्कमा रिटेनिङ्ग वाल निर्माण ।	५००	ल.ई. भएको	
३३	खाल्टे मास्दी मार्ग स्तर उन्नति तथा ग्यावियन जालीको काम ।	२०००	ल.ई. भएको	

फोटोहरु :

आमडाडा मास्दि मोटर मार्ग





तालबारि कृषि भवन





खाल्टे रंगशाला



खालटे पार्क





दरौखोला, छेरेंगाखोला र चिण्डेखोला घाट जाने बाटोहरु



कुसुन्डे मोटर मार्ग



जैथुम डिहि डाडा मोटर मार्ग



वडा नं. ३

गाउँसभाबाट स्वीकृत योजनाहरू :

#

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट रु. (हजारमा)	योजनाको स्थिति	कैफियत
१	भृकुटी मोटर मार्ग निर्माण	१,०००	ल.ई. भएको, सम्झौता नभएको	
२	हल्डुङ मोटर मार्ग निर्माण	१००	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, कार्य हुँदै	
३	जलदेवी मोटर मार्ग निर्माण	१००	ल.ई. भएको, सम्झौता नभएको	
४	फिदिमश्वारा मोटर मार्ग निर्माण	४००	सम्पन्न	
५	मनकामना मोटर मार्ग निर्माण	१००	सम्पन्न	
६	सेती नदीमा हिउँदे पुन निर्माण	९५०	सम्पन्न	
७	सुन्तला मोटर मार्ग स्तरोन्नती	३००	कार्य सम्पन्न, भुक्तानी हुन बाँकी ।	
८	सम्झना मोटर मार्ग निर्माण	४००	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, कार्य हुँदै	

८	सम्झना मोटर मार्ग निर्माण	४००	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, कार्य हुँदै
९	चण्डीदेवी मोटर मार्ग निर्माण	३५०	ल.ई. भएको, सम्झौता नभएको
१०	नागरिक सचेतना केन्द्र भवन निर्माण	२००	ल.ई. भएको, सम्झौता नभएको
११	सरस्वती आमा समूह भवन निर्माण	५००	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, कार्य हुँदै
१२	बालकेश मा.वि. भवन निर्माण	५००	सम्पन्न
१३	गोरखाकालिका आ.वि. डेस्क बेन्च बनाउने काम ।	१००	ल.ई. भएको, सम्झौता नभएको

अन्य योजनाहरू :

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट (ल.ई.) रु हजारमा	योजनाको स्थिति	कैफियत
१	वडा कार्यालय भवन तला थप	७००	काम शुरु नभएको	
२	बाल केश मा.वि. खा.पा., शौचालय, हात धुने ठाउँ बनाउने काम ।	८४		
३	गोरखाकालिका आ.वि. खा.पा., शौचालय, हात धुने ठाउँ बनाउने काम ।	८२		
४	६ ठाउँमा आरन पूर्वाधार	४२०		

५	नाल्बुड खा.पा.यो. (लिफ्टिङ)	२५००		
६	फिदिमस्वरा खा.पा.यो.	२७००		
७	मनकामना मार्ग (थप कार्य, वन समिति)	५००	सम्पन्न	
८	भृकुटी मार्ग मर्मत	४००	सम्पन्न	
९	सुत्तला मार्ग मर्मत	२५०	सम्पन्न	
१०	छिपछिपेभञ्ज्याङ सानुभञ्ज्याङ मार्ग मर्मत	१७५	सम्पन्न	
११	कफि तथा सुत्तला भवन मर्मत, छिपछिपे भञ्ज्याङ	३००	ल.ई. भएको	

फोटोहरु :

सेति नदि मा हिउदे पुल निर्माण



सुन्तला मोटर मार्ग स्तरउन्नति

ग्राबल तथा कच्ची नालि खने काम





मनकामना मोटर मागे













फिदिम स्वारा मार्ग











वडा नं. ४

गाउँसभाबाट स्वीकृत योजनाहरू :

✚

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट रु. (हजारमा)	योजनाको स्थिति	कैफियत
१	सिञ्च्याङ्ग सार्वड मोटर बाटो नयाँ ट्रयाक	१,५००	ल.ई. भएको, सम्झौता नभएको, तर काम भैरहेको ।	
२	दुईघरे ऐलिम मोटर बाटो नयाँ ट्रयाक	५००	ल.ई. भएको, सम्झौता नभएको, तर काम भैरहेको ।	
३	खोडे आमडाँडा मोटर बाटो नयाँ ट्रयाक	६००	सम्पन्न	
४	ज्यामिरे ढडाघारी मोटर बाटो नयाँ ट्रयाक	४००	काम भैसकेको, भुक्तानी हुन बाँकी	
५	काफलश्वारा मोटर मार्ग नयाँ ट्रयाक	४००	काम भैसकेको, भुक्तानी हुन बाँकी	
६	बेलश्वारा मोटर मार्ग नयाँ ट्रयाक	३००	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, काम गर्ने तयारीमा	

७	मोहोरिया चामनवेशी मोटर मार्ग नयाँ ट्याक	२००	ल.ई. भएको, सम्झौता नभएको, तर काम भैसकेको, भुक्तानी बाँकी ।	
८	काफलडाँडा बसेनी मोटर मार्ग नयाँ ट्याक	१५०	ल.ई. भएको, सम्झौता नभएको ।	
९	गाईघाट सामुदायिक भवन निर्माण	२५०	सम्पन्न	
१०	काफलडाँडा गुम्बा निर्माण	२५०	ल.ई. भएको , सम्झौताको लागि उ.स. सम्पर्कमा नआएको	
११	कर्ताप फुस्रेपानी देवघाट मार्ग	३०००	डि.पि.आर. भएको, सम्झौता नभएको	
१२	गाईघाट सिंच्याड छिपछिपेभञ्ज्याङ मार्ग मर्मत	४००	सम्पन्न	
१३	गाईघाट सिंच्याड छिपछिपेभञ्ज्याङ मार्ग ग्यावियन तथा स्तर उन्नति	२०००	ल.ई. भएको, सम्झौता नभएको ।	

अन्य योजनाहरु :



सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट, ल.ई. रु (हजारमा)	योजनाको स्थिति	कैफियत
१	गाईघाट सार्वजनिक शौचालय निर्माण	२५०	सम्पन्न	
२	आमडाडा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	१५०	काम हुदै	
३	पारलांग खोप केन्द्र निर्माण	३००	काम हुदै	
४	काफलडाडा स्कुल हात धुने ठाउ निर्माण	६९		
५	बिभिन्न खानेपानि योजनाहरु	६३००	ल.ई गरि प्रदेश पठाएको	

फोटोहरु :



















uf0{3f6 ;fd'bflos ejg



sfkmn8f8f :s'n dd{t tyf /+u/f]ug





uf03f6 ;fj{hlgs zf}rfno



वडा नं. ५

गाउँसभाबाट स्वीकृत योजनाहरू :

✚

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट रु. (हजारमा)	योजनाको स्थिति	कैफियत
१	भित्री शाखा बाटाहरू ग्राभेल र नाली कटिङ्ग मुल बाटो देखि शाखा) बाटो	८००	ल.ई. भएको	
२	सार्वजनिक जग्गा संरक्षण	२००		
३	कालीमाटी टोल हुँदै तालबारी झारखानी जोड्ने मोटर बाटोको भर्जनखोलामा कल्भर्ट टेक बहादुर) (थापाको घर छेउ	५००	सम्पन्न	
४	घिनाटार चक्रवर्ती स्कुल देखि देवपुर सम्म मोटर बाटो ग्राभेल तथा नाली निर्माण नाटारघि), देवपुर(१,०००	सम्पन्न	
५	शालीग्राम मोटर बाटो देखि क्वादी गाउँ सम्म बाटो मर्मत	१५०	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, काम गर्ने तयारीमा	

६	महादेव स्थान देखि सुमिटार मोटर बाटो निर्माण (साँढिबगर)	१५०	ल.ई. भएको, सम्झौता नभएको	
७	क्युदीटार देखि रातमाटे सम्म नयाँ ट्रयाक मोटर मार्ग (रातमाटे)	२००	सम्पन्न	
८	कमला देवी मन्दिर देखि झारखानी उकालो नाली (झारखानी)	२००	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, काम भैरहेको	
९	पुलको मुख देखि बट्टी केदार मुक्तिनाथ मार्ग मुलबाटो सम्म क्षेत्रीटोल), बोटे टोल	२००	साईट निरिक्षण भएको, काम गर्ने उ.स. सम्पर्कमा नआएको ।	
१०	चापागाई मन्दिर देखि ठिमुरा पुल सम्म नयाँ ट्रयाक मोटर मार्ग (घिनाटार)	१००	ल.ई. भएको, सम्झौता नभएको	
११	भर्जनखोला देखि कुनै कुना कमला	३००	सम्पन्न	

	देवी मन्दिर भुवनटार सम्म नयाँ ट्रयाक (गौरीटार)			
१२	झारखानी देखि क्युदी खर्क सम्म मोटर मार्ग बाटो विस्तार झारखानी), पिपलटार, क्युदी(२००	साईट निरिक्षण भएको, काम गर्ने उ.स. सम्पर्कमा नआएको ।	
१३	भर्जनखोला खेलमैदान निर्माण ।	५००	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, काम भैरहेको	
१४	सामुदायिक भवनहरु अपुरो पुरा गर्ने) झारखानी, कालीमाटी र पिपलटार(५००	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, काम भैरहेको	

अन्य योजनाहरु :

सि.न.	योजनाको नाम	ल.ई. रकम रु. (हजारमा)	योजनाको स्थिति	कैफियत
१	घिनाटार चक्रवती स्कुल दृखि देवपुर मोटर मार्ग ग्राभेल तथा नाली निर्माण (थप) ।	१०९५	काम सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी	

२	महेश्वर मार्ग (टाउन चोक देखि चक्रवती मन्दिर पूर्व गेट सम्म) निर्माण	२७४४	सम्पन्न	
३	भर्जन खोला देखि कुना कुना कमलादेवी मन्दिर हुदै भुवनटार मोटर बाटो (रिटेनिड वाल)	३६३	सम्पन्न	
४	५ नं वडा कार्यलय जाने बाटोको लागि ग्राभेल र मेसेनरी वाल निर्माण कार्य	३६८	सम्पन्न	
५	देवघाट बेणी संगम स्नानघाट निर्माण	१७००	सम्पन्न	पर्यटन मन्त्रालय
६	माहादेव जलकुण्ड संरक्षण योजना, साढेबगर	१८५	ल.ई. भएको	
७	साढेबगर सामुदायिक भवन निर्माण योजना	४६५	ल.ई. भएको	
८	देवपुर खेलमैदान तथा पार्क निर्माण	६००	ल.ई. भएको, सम्झौता भएको, काम भैरहेको	
९	ढुङ्गे धारा गणेशटोल टहरा निर्माण योजना	१९२	ल.ई. भएको	

१०	देवघाट प्रहार चौक भवनमा रङ्गरोगनको काम	१०६	सम्पन्न	
११	चक्रवर्ति आधारभुत विद्यालय भवनमा रङ्गरोगनको काम	११८	सम्पन्न	
१२	विद्यालय पुर्वाधार विकास निर्माण र इन्टरनेट जडान कार्यक्रम, बज्रयोगिनि मा.वि	११५४	ल.ई. भएको	
१३	देउपुर गुम्बामा रिटेनिड बाल र गेट निर्माण योजना	१६२	ल.ई. भएको	
१४	आमा समुह भवन निर्माण कार्य, महेशआश्रम नजिक	३९७	ल.ई. भएको	
१५	माहादेव प्रा.वि खेलमैदान निर्माण, सांढेबगर	८०६	ल.ई. भएको	
१६	कालिका मा.वि क्युदि को गेटमा रङ्गरोगनको काम	७८	ल.ई. भएको	
१७	ईलाका प्रहरी चौकि अगाडि खोल्सोमा माटो पुर्ने कार्य	५६	सम्पन्न	
१८	दासहुंगा मोड देखे विभिन्न स्थानमा खाल्डा खुल्डिमा ग्राभेल हालि बाटो मर्मत गर्ने कार्य	१४५	सम्पन्न	
१९	महेश आश्रम वरपरका बाटाहरु विभिन्न स्थानमा खाल्डा खुल्डिमा ग्राभेल हालि बाटो मर्मत गर्ने काय	१९५	सम्पन्न	

२०	जनकल्याण साना सिंचाइ योजना	२००	ल.ई. भएको	कृषि
२१	गौरीटार साना सिंचाइ योजना	२००	ल.ई. भएको	
२२	सापकोटा बन्धु कृषि फर्म	१४०	ल.ई. भएको	
२३	हाटबजारको टहरा निर्माण कार्य	२०००	ल.ई. भएको	
२४	रेडक्रस भवन तला थप निर्माण योजना	८९७	ल.ई. भएको	
२५	कालिमटि तल्लोटारमा ह्युमपाइप राख्ने कार्य	६०	ल.ई. भई सम्भौता भएको	
२६	सरसफाइ सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण, बज्रयोगिनि मा.वि.	१०१	ल.ई. भै सम्भौता भएको	
२७	सरसफाइ सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण, कालिका मा.वि.	१०७	ल.ई. भै सम्भौता भएको	
२८	सरसफाइ सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण, सिद्ध महाकाली मा.वि.	१०५	ल.ई. भै सम्भौता भएको	
२९	क्युदि लिफ्ट खानेपानि योजना	४९६	ल.ई. भएको	
३०	क्युदिखोला पिपलटार झारखानि	१२१	ल.ई. भएको	

	खानेपानि योजना			
३१	भाडखोला लिफ्ट खानेपानि योजना	६६६	ल.ई. भएको	
३२	भेल्दारगैरा लिफ्ट खानेपानि योजना	५१३	ल.ई. भएको	
३३	तारिका खोला (क्षेत्रिटोल) लिफ्ट खानेपानि योजना	४८८	ल.ई. भै सम्भौता भएको, काम हुँदै	
३४	बटौलि खानेपानि योजना (मुहान संरक्षण)	२०८	ल.ई. भएको	
३५	रानिपानि कालिमाटि खानेपानि योजना	५५८	ल.ई. भएको	
३६	रानिपानि गुहेटार खानेपानि योजना	१७३	ल.ई. भएको	
३७	देउति छरछरे कालोपानि मुहान खानेपानि योजना	७९५	ल.ई. भएको	
३८	सिन्दुरेखोला खानेपानि योजना	३०१	ल.ई. भएको	
३९	साउनेटार खानेपानि योजना	१६९	ल.ई. भएको	
४०	वडा न ५ कार्यालयको खानेपानि सम्बन्धि पुर्वाधार निर्माण	३८७	ल.ई. भएको	
४१	मुकुन्देश्वरी प्राथमिक विधालयमा लिफ्ट खानेपानि योजना	२००	ल.ई. भएको	पाईप
४२	शिक्षा शाखा भवन निर्माण तथा मर्मत (साविक श्रोत केन्द्र भवन, वज्रयोगीनी मा.वि. परिसर)	५५०	सम्पन्न	

४३	देवघाट धर्मार्थ अस्पताल स्टोरभवन, कम्पाउण्ड, पार्क निर्माण	१३००	सम्पन्न	
४४	देवघाट धर्मार्थ अस्पताल भवनको तलाथप तथा मर्मत	१००००	ल.ई. भएको	मन्त्रालय पठाएको
४५	श्री स्वस्थानी राम भजन मन्दिर, पूलको मुख कम्पाउण्ड तथा विविध निर्माण कार्य	५००	कार्य हुदै	
४६	चक्रवर्ती महिला उच्चमी सहकारी भवन कम्पाउण्ड तथा भवन मर्मत कार्य	३००	सम्पन्न	
४७	ईलाका वन कार्यालय भवन ट्रेस तथा मर्मत	५००	सम्पन्न	
४८	महिला सञ्जाल भवन ट्रेस तथा अधूरो भवन पुरा गर्ने कार्य	५००	सम्पन्न	
४९	शालिग्राम कोरिडोर ग्यावियन तथा बाटो स्तरोन्नति कार्य ।	१५००	सम्झौता भई कार्य हुदै	
५०	दासढुंगा देवघाट मार्ग कालोपत्रे ।	१८००००	ल.ई. गरेको	मन्त्रालय पठाएको

फोटोहरु :

टाउनचोक देखि महेश आश्रम मार्ग











भर्जनखोलामा स्ल्याब कलभर्ट निर्माण कार्य





इलाका प्रहरि चौकि भवनमा रंगरोगन लगाउने कार्य





धर्मास्थ हस्पिटल परिसरमा पार्क निर्माण कार्य





चक्रवर्ति स्कूल देखि देउपुर मार्ग निर्माण कार्य





भर्जनखोला कुना कुनै सडक निर्माण कार्य





क्युदि रातमाटे सडक निर्माण कार्य



५ नं वडा कार्यालय जाने सडक निर्माण कार्य





बेनि संगमा तिर्थ स्नान निर्माण कार्य











भर्जनखोला खेलमैदान निर्माण कार्य



मिलिजुल आमा समुह भवन निर्माण कार्य



चक्रवर्ति महिला सहकारि कम्पाउन्ड तथा भवन मर्मत कार्य



श्री स्वस्थानि मन्दिर कम्पाउण्ड तथा मर्मत कार्य



လက်ရှိလုပ်ငန်းများ







उर्जा तथा वातावरण इकाईबाट भएका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूको संक्षेप

दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन:

+

क्र.सं	क्रियाकलाप । कार्यक्रमको विवरण	
१	छेरङ्गा लघुजलविद्युतिको मर्मतको लागि ईष्टिमेट तयार	
२	विद्युतिकरण विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको ईष्टिमेट, मुल्यांकन, सम्झौता तयार गरेको	
३	बालाचतुर्दशी र माघे संक्रान्तिका दिन खरिद विद्युतिय सामग्रीहरू खरिद, ईष्टिमेट र जडान कार्य सम्पन्न	
४	कोटा, कोटबैदि, छेरङ्गामा सोलार लिफ्टिङ योजनाका लागि सर्भे	
५	कोटा, साराङ्घाट विद्युतिकरणको ईष्टिमेट र सम्झौता	
६	तनहुँ हाईड्रोपावरको कन्सल्टयान्ट टिमसँग विद्युतिकरण सर्भेको लागि वडा नं २, १, ३ मा गएको	
७	वडा नं २ को स्वास्थ्य चौकीमा संस्थागत सोलार जडानको ईष्टिमेट	
८	वडा नं २ र ३ को वडा कार्यालयमा रहेको संस्थागत सोलारको मर्मतको लागि ईष्टिमेट	

९	सीता सामुदायिक वनको पिक्निक क्षेत्रमा विद्युतिकरणको ईष्टिमेट र सम्झौता	
१०	देवघाट-५ को भुवनटार,सेतीभितेरी,कालीभितेरी र साढेबगरबाट ढुंगा,गिट्टी,बालुवा उत्खननका लागि जिल्ला समन्वय समितिबाट कार्यसुची र आ.ई.ई. प्रतिवेदन स्वीकृतिका साथै ठेक्काको सुचना प्रकाशन गरिएको	
११	देवघाट-१,२,३,४ वडाको विभिन्न घाटहरुबाट ढुंगा,गिट्टी,बालुवा उत्खननका लागि जिल्ला समन्वय समितिबाट कार्यसुची र आ.ई.ई. प्रतिवेदन स्वीकृतिका ठेक्काको सुचना प्रकाशन गरिएको	
१२	जलवायु अनुकूलन गाउँ कार्यक्रमको अनौपचारिक छलफल,वडा नं१ कालिकाटारमा राखे सहमति	
१३	विभिन्न समयमा घाटहरुको अनुगमन	

उर्जा तथा वातावरण ईकाईबाट भएका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूको संक्षिप्त तेश्रो चौमासिकको

लक्ष्य:

+

क्र.सं	क्रियाकलाप । कार्यक्रमको विवरण	
१	आईलिम तल्लो खण्ड, माथिल्लो खण्ड र चामनघाटबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि ठेक्काको सुचना प्रकाशन	
२	वैदी स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालय २ र ३ मा संस्थागत सोलार जडान गर्ने	
३	छेरङ्गा र काफलझारा सोलार लिफ्टिङ योजना सम्पन्न गर्ने	
४	जलवायु अनुकूलन गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याई सम्पन्न गर्ने	
५	काफलडाँडा, आईलिम र साराङघाट विद्युतिकरण योजनाहरू सम्पन्न गर्ने	
६	गलेश्वर आश्रममा बाँयोग्याँस प्लान्ट निर्माण गर्ने	
७	सम्झौता भएका घाटहरूको अनुगमन गर्ने	
८	सम्झौता भएका योजनाहरूको अनुगमन, मुल्यांकन र प्रतिवेदन तयार गर्ने	

sf]6fdf !)) s]=le=P= 6«fG;km/d/ h8fg



sf]6fd} \$% j6f * ld= kf]n h8fg



भवन नियमन तर्फ :

नयां नक्सापास तर्फ :

आवेदन दिनेको संख्या : १६६

निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिनेको संख्या : १२

अभिलेखिकरण तर्फ :

आवेदन दिनेको संख्या : २५

अभिलेखिकरण प्रमाण पत्र लिनेको संख्या : ३९ (अघिल्लो साल आवेदन दिएको समेत)

५. कार्यान्वयनको प्रक्रिया : धेरैजसो योजना उपभोक्ता समिति मार्फत, केहि ठेक्कापट्टा मार्फत ।

६. उपलब्धी : मोटर मार्गको निर्माण तथा मर्मत सम्भारले गर्दा अधिकांस सडकहरुमा सानाठुला यातायातका साधन सञ्चालनमा आई जनतालाई सेवा सुविधा पुगेको तथा खानेपानिको पाइप वितरणले सानाखालका फुटकर योजनाहरुबाट तत्कालको लागि खानेपानिको समस्या समाधान भएको छ ।

७. यस कार्यले भएको परिवर्तन : जनताले केहिहदसम्म भएपनि राहतको महसुस गरेका छन कि.....

८. समस्या :

- उपभोक्ताहरु समयमा सम्पर्कमा नआएको कारण ल.ई. तयार भएर पनि हालसम्म सम्भौता भई कार्य शुरु हुन नसकेको ।
- खानेपानी योजनाहरुको ल.ई. भएतापनि बजेट विनियोजन नभएको कारणले सम्भौता हुन नसकेको ।
- उ.स. को तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने लागत सहभागिता सम्भौताको बेला अनिवार्य गरिएको हुंदा उक्त रकम जुटाउन नसकेको कारण पनि सम्भौतामा ढिलाई भएको ।
- निर्माण कार्यको सम्बन्धमा टोल विकास संस्था र उ.स. बिच समन्वय हुन नसकेको ।
- उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यको लागि दक्ष जनशक्ति नभएको कारण काममा ढिलाई हुनुको साथै गुणस्तर समेत नहुने गरेको ।
- ठेक्कापट्टा मार्फत गरिने कार्यमा समेत अनुभवी तथा जिम्मेवार निर्माण व्यवसायी नहुने, बाहिरबाट अन्य फर्मको कागजात ल्याई ठेक्का हाल्नु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा गई काममा ढिलासुस्ती हुनुको साथै गुणस्तर समेत नहुने गरेको ।

- प्राविधिकहरु फिल्डमा विहान देखि राती अबेरसम्म काम गर्नुपर्दा समेत विना अतिरिक्त भत्ता (ओ.टी.) तथा दै.भ्र.भ. खट्ने गरेको । यस सन्दर्भमा तनहुँ जिल्लाका अन्य सबै स्थानीय तहमा फिल्ड भत्ता दिने गरेता पनि देवघाट गाउँपालिकाका प्राविधिकहरुले हालसम्म उक्त सुविधा नपाएकोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू मार्फत अध्यक्ष ज्यू, उपाध्यक्ष ज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरु र सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यज्यूहरुको ध्यानाकर्षण गराउंदछौं ।

९. सुझाव :

- उ.स. लाई सम्भौता गरि समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
- लागत सहभागीता सम्बन्धमा के गर्ने ।
- टोल विकास संस्था र उ.स. बिच निर्माण कार्यमा समन्वय हुनुपर्ने ।

१०. आगामी चौमासिकको लक्ष्य :

- प्रथम तथा दोश्रो चौमासिकमा शुरु भै सम्पन्न हुन नसकेका बांकी योजनाहरु सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने ।
- तेश्रो चौमासिकमा भएका योजनाहरु समेत सकभर शुरुमा (चैत्र, बैशाख) मा नै सम्पूर्ण योजना सम्पन्न गर्न पहल गर्ने ।
- आगामी आ.व. को लागि गाउँसभामा स्वीकृत गर्नुपर्ने योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, निरिक्षण तथा लागत अनुमान तयार गरी पेश गर्ने ।



wGojfb

देवघाट गाउँपालिका कृषि ईकाइको
दोस्रो चौमासिक प्रगति
प्रतिवेदन

प्रस्तुतकर्ता

आनन्द राज घिमिरे

प्रा. स.

दोस्रो चैमासिकको समिक्षा प्रतिवेदन ढाचा

- शाखा ईकाइ अन्तर्गत कार्यरत जनसक्ति संख्या ५ जना
- सम्पादन गरिएका कार्यहरुको फोटो तपसिलमा छ ।
- कार्यन्वयनको प्रकृया : प्राया सबै कार्यक्रमहरु ५० प्रतिशत अनुदानमा रहेका छन ।
- उपलब्धि : क्रमिक रुपमा कृषकहरु व्यावसायिक खेति तर्फ उन्मुख

यसकायल मएका पारवतन

- ब्याबसायिक खेति तर्फ उन्मुख ।
- कृषक र प्राविक बिचको अन्तर कृया कार्यक्रमा वृदि भएको छ फलस्वारुप आधुनिक कृषि प्रविधि र उन्नत बिउ बिजन प्रयोग तर्फ उन्मुख भएका छन ।
- प्रत्येक वडामा कृषि प्रषविधिकको व्यावस्था गरिनाले कृषि सम्बन्धि समस्याको समाधान पाउनका लागि गा.पा. तथा जिल्ला स्तरिय कार्यालयहरु धाउन परेको छैन जसले गर्दा कृषकको समयको वचत भएको छ ।
- कृषकहरु रासायनिक बिषादी र रासायनिक मलको प्रयोगबाट पर्ने असरको बारेमा जानकार भएका छन् । तसर्थ जैविक र घरायसी विषादीहरु प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
- कृषकहरुमा खोजे पाईन्छ गरे हुन्छ भन्ने भावनाको बिकास भएको छ ।

- समस्या : उन्नत विउ विजन सम्बन्धि कृषकमा चेतना नहुनु ।
- कार्यालयको नीति नियममा कृषकको ध्यान नजानु ।
- सुचना प्रकाशनमा ध्यान नजानु ।

व्यावसायिक
तरकारी खेति
तालिम १

७५० के.
गहुको बिउ
वितरण

१००० किट
लहरे तरकारी
बिउ वितरण

देवघाट
गाउँपालिका
कृषि ईकाइ

आलुको बिउ
३२००
के.जि.वितरण

च्याउ
तालिम ९,
सुन्तला ३

७५० बोटल
च्याउ बिउ
वितरण

व्यावसायिक
गोलभेदा खेति
तालिम

नियमित
प्राविधिक कृषक
भेटघाट र
प्रविधि बिस्तार

आधुनिक
मौरीघाट
वितरण

नारायणगढ तरकारी तथा फलफुल बजारको मुल्य अनुसुची (नेपाली तरकारी)

क्र. स.	विवरण	थोक मुल्य रु	प्रति के. जि. खुद्रा मुल्य	कैफियत
१,	काउलि	१५ - २०	२० - ३०	
२	वन्दा	१० - १५	१५ - २०	
३,	गोलभेडा	५० - ६०	७० - ८०	
४,	मूला	१० - १२	१५ - १८	
५,	रायो	१० - १५	१५ - २०	
६,	भन्टा	२० - ३०	४० - ५०	
७,	काक्रा	५० - ६०	७० - ८०	
८,	लौका	३० - ३५	४० - ५०	
९,	च्याउ	१०० - १२०	१५० - १८०	
१०,	तरुल	३० - ४०	५० - ६०	
११,	आलु	१५ - २०	२० - ३०	
१२,	घिउ सिमी	४० - ६०	६० - ८०	

पहिलो चौमासिकको प्रगति विवरण

क्र. स.	विवरण	ईकाइ	परिमाण	पहिलो चौमासीक लक्ष्य	पहिलो चौमासीक प्रगति	कैफियत
१,	तालिम	गोटा	६	६	६	१ दिने कार्यक्रम हुनाले तालिम प्रभावकारी हुन नसकेको
२,	भुईकटहर	संख्या	१५००	१५००	१५००	माग पुरा गर्न नसकेको
३,	स्प्रेयरको माग संकलन	संख्या	२६	२६	-	
४,	आलु बिउ	कुन्ट ल/के. जि.	४५	४५	४३	गत वर्षको बिउको प्रतिफल राम्रो आएकोले माग वढी ।
५,	प्लास्टिक क्रेट	संख्या	५००	५००	-	पहिलो चौमासिकमा माग नआएकोले दोस्रोमा माग संकलन हुदै ।
६,	मिनि टेलर/अन्य कृषि सामाग्री	संख्या				मिनिटेलर माग नआएकोले

दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

क्र. स.	विवरण	ईकाइ	परिमाण	दोस्रो चौमासिक लक्ष्य	दोस्रो चौमासिक प्रगति	कैफियत
१,	लहरे तरकारी किट वितरण	संख्या	१०००	१०००	१०००	माग बढीरहको
२,	मकै बिउ वितरण	के.जि.	१५००	१५००	-	समयमा कृषकको माग नआएकोले माग पुरा गर्न गारो
३,	प्लास्टिक टनेल	संख्या	१५	१५	-	माग संकलन हुदै
४,	मौरी घर वितरण	संख्या	७०	७०	७०	माग पुरा हुन नसकेको (८० मार्ग)
५,	तालिम	१५	१५	१५	१२	आवस्यकता अनुसार संचाल हुदै ।
६,	सोलार सिंचाई	-	-	-	-	गा.पा . मार्फत संचालन गरिने
७,	अन्तर वडा भ्रमण	-	-	-	-	छलफलको क्रममा

दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

क्र. स.	विवरण	ईकाइ	परिमाण	दोस्रो चौमासिक लक्ष्य	दोस्रो चौमासिक प्रगति	कैफियत
१,	कृषि सहकारी बिउ बिजन तथा मल अनुदान	के.जि.	१०००	१०००	-	कार्यक्रम हुन बाँकी
२,	अर्गानिक कृषि खेति प्रवर्धन तालिम तथा जैविक बिसादी र मल वितरण	संख्या	५	५	-	धान खेति तथा सुन्तला खेति तालिम तथा अर्गानिक मल वितरण

व्यावसायिक च्याउ, सुन्तला तथा तरकारी खेति तालिम

स्थलगत कृषक तालिम तरकारी खेती

स्थान: देवघाट गा.पा. वडा नं. १, सभा हल

मिति: २०७५ कार्तिक १३, १४ र १५



आयोजक:-

देवघाट गाँउपालिका
१ नं. वडा कार्यालय







७५० के. जि. गौतम जातको गहुको बिउ बितरण



३२०० के. जि. आलुको बिउ वितरण २ - ५



७५० बोतल च्याउको बिउ वितरण तथा ९ वटा





देवघाट ५, देवघाट







१००० किट तरकारी बिउ ५० प्रतिशत अनुदान मा वितरण



देवघाट ५, वडा स्तरिय गोलभेडा खेति तालिम





सधारिएको कम्पोस्ट मल बनाउने तरिका









मकैको बिउ बितरण



तेस्रो चौमासीकको लक्ष्य

- उन्नत जातको धानको बिउ वितरण ।
- फलफुल बिरुवा वितरण अमिला जातका फलफुल, केरा, आँप, लिचीका बिरुवा बितरण ।
- धान खेति सम्बन्धि तालिम ।
- उत्कृष्ट कृषक पुरस्कृत कार्यक्रम ।
- अनुगमन
- साना सिंचाई तथा भकारो सुधार अनुगमण ।

सूचना प्रकाशित तथा माग संकलन

- सामा सिंघाई कार्यक्रम माग संकलन ९, कार्यक्रम स्विकृत - ६, उपभोक्ता र कार्यालय बिच सम्झौता काम जारी ।
- प्लास्टिक क्रेट माग - ५२०
- आधुनिक मौरी घर माग ८० वितरण ७०
- मिनिटीलर सूचना प्रकाशित - माग आउन नसकेको अवस्था
- माग २५ कार्यक्रमको क्षमता १४ वटा ।
- उन्नत जातको मकैको बिउ रामपुर कम्पोजिट, अरुण - २ र मानकामाना सूचना प्रकाशित ।
- भकारो सुधार कार्यक्रम सूचना प्रकाशित ।

दोस्रो चौमासीक लक्ष्य

- दोस्रो चौमासीकको प्लास्टिक टनेल वितरण
- दोस्रो चौमासिकको कृषि सहकारी बिउबिजन तथा मल अनुदान कार्यक्रम ।
- दोस्रो चौमासिकको धान खेति तथा सुन्तला खेति तालिम तथा अर्गानिक मल वितरण ।
- पहिलो चौमासिकको कृषि सामाग्री (प्लास्टीक पोखरी) वितरण कार्यक्रम ।
- अन्तर्र जिल्ला भ्रमण ।

अनुगमन कार्यक्रमहरु

१ – ५ वडा

- तरकारी खेति अनुगमन १,४ र ५ मा
- च्याउखेति अनुगमन १,२,३,४ र ५ ।
- केरा खेति अनुगमन वडा नं. १ र ५
- सुन्तला नर्सरी तथा सुन्तला बगैचा अनुगमन वडा नं. १, २,३ र ४ ।
- कफी नर्सरी अनुगमन वडा नं. – २
- देवघाट ५ र २ मा पुर्ण सरसफाई अनुगमन ।
- पथिक फाउन्डेसन फलफूल बगैचा अनुगमन ।
-

- सुन्तला पोष्टहार्भेष्ट व्यावस्थापन तथा ग्रेडिडमा सहयोग तथा अनुगमन २ -३
- कोटवैदि कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा लगाईएका फलफुल बिरुवामा मल खाद व्यावस्थापन कार्य अनुगमन वडा नं. २
- पुर्ण सरसफाई घोषणा क्षेत्रको अनुगमन तथा निरिक्षण सुचारु वडा नं. २
- फलफुल बिरुवामा मलखाद व्यावस्थापनमा सहयोग देवघाट ५ साडेवगर













बालि बिरुवामा देखिएका समस्याहरू

- Citrus greening Disease
- Citrus canker
- Steam borer
- Leaf blight
- Early blight
- च्याउमा समस्या छैन ।
- फेद कुहने रोग
- भाईरस
- अल्टरनेरिया लिफ स्पोट
- बोडीमा सिन्दुरे



Leat Blight



भाईरस, अल्टरनेरिया लिफ स्पोट





5356842



1;6«; lu |lg^a\u (Citrus greening disease)

65 6 16 1 /01



1;6«; SofGs/ (Citrus canker)





बिरुवा
अवस्थामा
बढी देखिने
रोग यसको
प्रकोप बढि
छ ।

बालिमा लाग्ने किराको समस्या

- गोलभेडाको फल छेदक किरा प्रकोप ।
- सिट्रस जातका फलफुलमा Steam borer को समस्या पछिल्लो समयमा बढेको छ ।
- फेद कटुवा किराको प्रकोप
- धमिरा, कमिला, लाहि आदिको प्रकोप
- सुन्तलामा पतेरो, झुसिलकिरा, फल कुहाउने औसा

गोलभेडाको फल छेदक किरा



सुन्तलाको बोरर



फेद कटुवा किरा



सुन्तलामा औसाह पार्ने किरा




Photo by Scott Bauer

बालि बिरुवामा खाध्त्व कमिका लक्षणहरू

- काउली बन्दामा बोरन क्याल्सियमको कमी
- सुन्तला तथा गोभेडामा फोस्फोरसको कमी
- सुन्तलामा क्याल्सियमको कमी
- काउली, बन्दा तथा गोलभेडामा पोटासको कमी
- कागतिमा बोरनको कमी



HGIC, U of MD

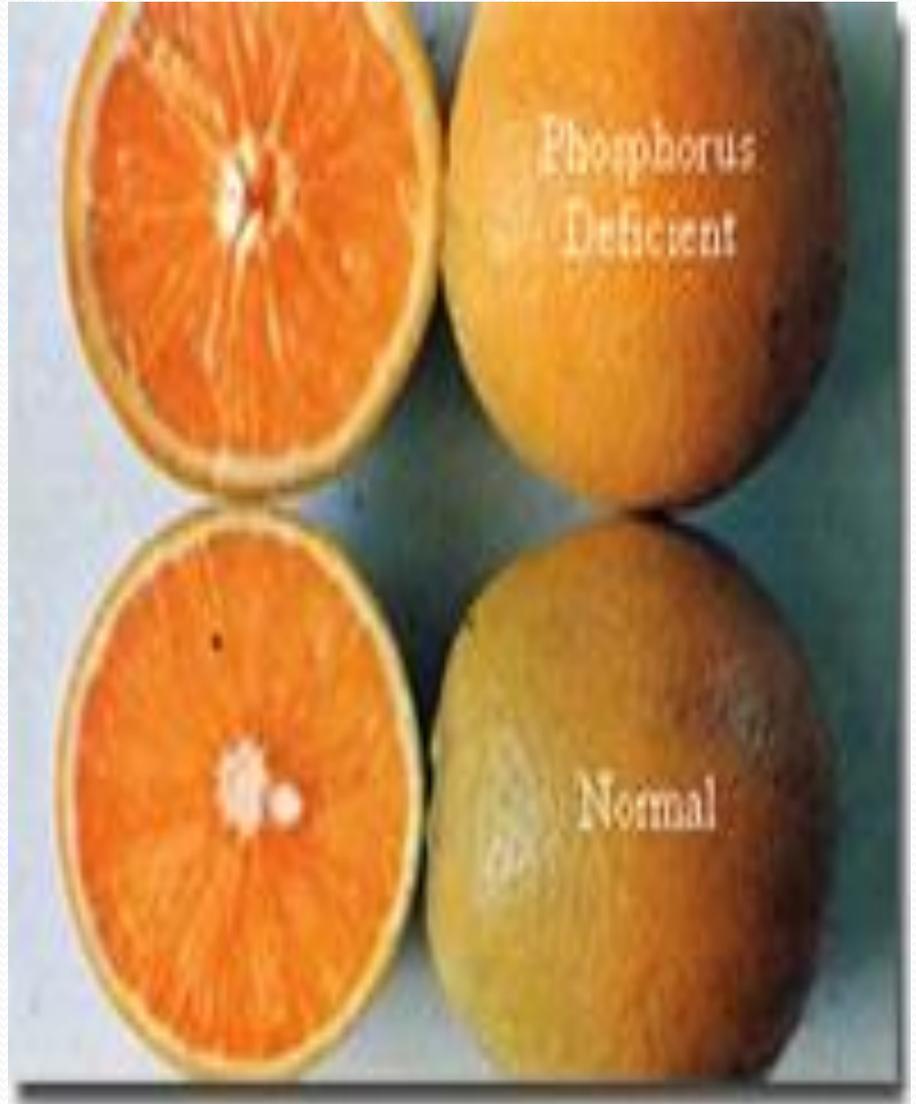

गोलभेडामा क्याल्सियम र पोटासको कमी



काउली र बन्दामा क्याल्सियम र पोट्यासको रोग





कृषकको मागहरु

- वडा नं. १,२,३ र ४ मा अमिला जातका फलफुल बगैचा व्यावस्थापनको लागि बिडो पेष्टको माग।
- वडा नं. ५ मा आँप लिचि बगैचा व्यावस्थापन तथा बगैचा सुदृडीकरणको लागि कार्यक्रम संमचालनको माग
- व्यावसायिक बालिहरु गोलभेडा,च्याउ तथा बेमौसमी तरकारीहरुको गाउँपालिका स्तरिय तालिमको माग
- कृषकको उत्पादित फलफुल तथा तरकारी,बजारको अभावमा उत्पादित उत्पादनहरु खेरजाने अवस्थाले गर्दा देवघाट ५ मा हाटबजार तथा संकलन केन्द्रको माग ।
- सानातिना कार्यक्रम संचालन भन्दा सिंचाईको कार्यक्रम भएमा कृषि क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने थियो कि । अधिकाम्स कृषकको भनाई ।

सुझावहरू

- देवघाट गाउँपालिका भित्रका बिदेश गएर फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गरी व्यावसायिक तरकारी/फलफुल/तथा च्याउ खेति तर्फ उन्मुख गरि स्वरोजगार सृजना गर्ने
- रासायनिक मल र बिषादीको न्युनिकरण गर्न जैविक मल र बिषादीको प्रयोग बढी गर्न पर्ने ।
- आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग गर्न गह्रासुधार कार्यक्रम संचानल गर्नु पर्ने ।
- नमूना/पकेट क्षेत्र छनौट गरिएका कृषक समुहहरूमा लक्षित गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिनुपर्ने ।
- कृषकहरूका मागका आधारमा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने थियो ।

दोश्रो चौमासिक समिक्षा

आ.व. २०७५/७६

प्रस्तुत कर्ता

प्रदिप सापकोटा

पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक

देबघाट गाउँपालिका

पशु सेवा ईकाइ

देबघाट, तनहुँ

- शाखा/ इकाईको नाम : पशु सेवा इकाई
- कार्यरत जनशक्ति : ५ जना

रोग
नियन्त्रण
कार्यक्रम

नष्ल
सुधारको
लागि
कृ.ग
कार्यक्रम

कालो
च्वाचे
प्रबर्धन
कार्यक्रम

कृषि
सामाग्री
अनुदान

उपचार
तथा प्रयोग
शाला सेवा
कर्यक्रम

कृषक
पाठसाला
कार्यक्रम

लोकल
कुखुरा
प्रबर्धन
कार्यक्रम

पकेट
क्षेत्रमा
बारव्रा
बिकासस
कार्यक्रम

पशु
स्वास्थ्य
डीजीज
सर्भिलेन्स
कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम बिबरण	ईकाइ	लक्ष	प्रगति	कैफियत
१	सामग्री वितरण ५० प्रतिशत अनुदान				
१.क	डीजीटल तराजु बितरण ५० प्रतिशत अनुदान	संख्या	४	-	कृषक समुहमा सुचना जारी गरीएको छ ।
१.ख	बडीजो काष्टेटर बितरण	„	४	-	„
२	कालो च्वाचे प्रबर्धन कार्यक्रम				
२.क	तालिम तथा अभिमुखीकरण कालो	पटक	१	१	कोटामा
२.ख	खोर निर्माण ५०% अनुदानमा	„	१	-	निर्माणाधिन अबशथामा
२.ग	पाठा खरीद	संख्या	१२	-	कृषक समुहमा सुचना जारी गरीएको छ ।

क्र.सं.	कार्यक्रम बिबरण	ईकाइ	लक्ष	प्रगति	कैफियत
३	पकेट क्षेत्रमा बारवा बिकास कार्यक्रम				
३.क	पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	पटक	४	४	बारवा पकेट क्षेत्रमा
३.ख	कृ.ग. अभिमुखीकरण तथा बारवापालन तालिम	पटक	४	३	
३.ख	खोर मर्मत	संख्या	२००	-	कृषक समुहमा सुचना जारी गरीएको छ ।
३.ग	बोका बितरण	संख्या	४	-	कृषक समुहमा सुचना जारी गरीएको छ ।
४	लोकल कुखुरा प्रबर्धन कार्यक्रम				
४.क	कुखुरापालन तालिम	पटक	३	३	

क्र.सं.	कार्यक्रम बिबरण	ईकाइ	लक्ष	प्रगति	कैफियत
४.ख	चल्ला बितरण ५० प्रतिसत अनुदानमा	संख्या	७०००	-	चल्ला उत्पादनको लागि पत्राचार गरिएको
४.ग	चल्ला ढुवानी	पटक	१	-	
४.घ	औषधी बितरण	पटक	१	-	
५	नष्ट सुधारका लागि A.I कार्यक्रम				
५.क	A.I कार्यक्रम	संख्या	१५०	१९१	गाई १७१, भैसी १४, बारवा ६ गोटा
५.ख	बाझोपन निवारण शिबीर	पटक	१	-	शिबीरमा पशु ल्याउदा दुधालु पशु लाई तनाब हुने हुदा बाझोपन निवारण घरदैलो कार्यक्रम गर्दा राम्रो हुने ।
६	पशु स्वास्थ्य, डीजीज सर्भिलेन्स, क्वारेण्टाइन				
६.क	नमुना शंकलन र प्रेशण	पटक	१	३	
६.ख	पशु स्वास्थ्य, औषधि खरीद तथा बितरण	पटक	१	१	निशुल्क बितरण

क्र.सं.	कार्यक्रम बिबरण	ईकाइ	लक्ष	प्रगति	कैफियत
७	तालिम				
७.क	तालिम सहायक कर्मचारी स्तर	पटक		३	क्षे.प.से.ता.के. पोखराको अयोजनामा
७.ख	तालिम कृषक स्तर	जना		३	नेपाल लाईभस्टक सेक्टर ईनोभेशन आयोजनाको आयोजनामा
८	मेडीकल उपचार सेवा				
८.क	छेरौटी	संख्या	८०	४६०	
८.ख	थुनेलो उपचार	„	२०	३१	
८.ग	सी.आ.डी	„	-	१५१०	कुखुरामा
८.घ	कोलीब्यासीलोसीस	„	-	१७५	कुखुरामा
८.ङ	ज्वरो	„	१५०	१९३	
८.च	खोकी	„	१२५	२४५	
८.छ	कमजोरी	„	२००	२०५	
८.ज	पीसाब बन्द हुने	„	२५	४०	
८.झ	अरुची	„	१००	१४०	
८.ञ	पेट फुल्ने	„	७५	९३	
८.ट	बि.डब्लु.डी.	संख्या	-	-	
८.ठ	मार्नर सर्जिकल उपचार	„	३००	५१६	बोका,गोरु सुमार्ने कार्य

क्र.सं.	कार्यक्रम बिबरण	ईकाइ	लक्ष	प्रगति	कैफियत
८.ढ	मेजर सर्जिकल उपचार	संख्या	३०	३८	बंगुर सुमार्ने कार्य
९	गाईनाक्लोजिकल उपचार				
९.क	साल अड्कने	संख्या	२०	२३	
९.ख	बच्चा अड्कने	संख्या	२०	२३	
९.ग	उल्टीईरहने	„	२०	३१	
९.घ	भण्डार फर्कने	„	२०	२८	
१०	परजीबी नियन्त्रण सेवा				
१०.क	आन्तरीक परजीबी	संख्या	३०००	३२००	
१०.ख	बाह्य परजीबी	संख्या	१६००	१७७६	
११	प्रयोगशाला सेवा				
११.क	गोबर परिक्षण	संख्या	२००	२२०	
११.ख	दुध परिक्षण	„	२०	२५	
११.ग	रगत परिक्षण	„	-	-	
११.घ	पिसाब परिक्षण	„	-	-	
१२	रोग नियन्त्रण खोप सेवा	संख्या	५००	५५५	FMD,Rabies vaccination




































आँखाको रोगहरू

आँखाको रोगहरूको कारण र रोकथाम

आँखाको रोगहरूको कारण र रोकथाम

आँखाको रोगहरू

आँखाको रोगहरूको कारण र रोकथाम

आँखाको रोगहरूको कारण र रोकथाम

आँखाको रोगहरू

आँखाको रोगहरूको कारण र रोकथाम

आँखाको रोगहरूको कारण र रोकथाम

आँखाको रोगहरू

आँखाको रोगहरूको कारण र रोकथाम

आँखाको रोगहरूको कारण र रोकथाम

देवघाट गाउँपालिका

सञ्चालित कार्यक्रमबाट लाभान्वीत सेवाग्राहीहरु

क्र.सं	कर्यक्रमको बिबरण	लाभान्वित सेवाग्राहीहरु			जातिय			कैफियत
		महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	
१	सामुदायीक स्तरमा बारब्रापालन कार्यक्रम	८१	११९	२००	५	१७४	२१	
२	कृ.ग. कार्यक्रम	१९	१७२	१९१	१	१९	१७१	
३	खोप कार्यक्रम	५७	२४	८३	-	२७	५४	२ संस्थागत
४	बारब्रापालन तालिम	३१	५८	८९	६	८०	३	
५	कुखुरापालन तालिम	#)	^!	(!	६	*@	३	
६	तालिम सहायक स्तर कर्मचारी	१	२	३			३	
७	तालिम कृषक स्तर		३	३		१	२	

कृषकका मागहरु

- दुध चिस्याउने मेसिन
- च्यापकटरको माग
- वोयर वोका माग

उपलब्धिहरु

- ब्यबसायीक रुपमा पशुपालन गर्ने कृषकको संख्यामा बृद्धी यसले गर्दा स्वरेजगार सिर्जना भएको छ ।
- कृषक समुह समिति मार्फत सामुदायीक स्तरमा बाख्रा प्रबर्धन भएको
- खोप कार्यक्रमले माहामारी रोग नियन्त्रणमा टेवा पुगेको छ ।
- क.ग. कार्यक्रमले नष्ट सुधारमा टेवा पुग्नुको साथै कृषकहरु प्रजनन योग्य भाले पशु पाल्ने झन्झटबाट मुक्त र यसबाट हुने सम्भावीत हानीनोकसानीबाट सुरक्षीत भएकाछन् ।
- उपचार सेवा मार्फत कृषकहरुको पशुपंक्षी उपचारमा सहयोग पुगेको छ ।

;d:of

- भौगोलिक बिकटता तथा यातायातको साधनको अभावका कारण समयमानै कार्य सम्पादन गर्न कठिनाइ भएको ।
- कृषकहरु जागरुक नभएको ।

;emfa

- यातायातको साधन भएमा कार्य सम्पादन गर्न सहज हुने थियो ।
- प्राविधिक कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धी सम्बन्धि तालीमको ब्यबस्था भएमा राम्रो हुने थियो ।

आगामी चौमासिक लक्ष्यहरू

- दोश्रो चौमासिकमा सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने
- घाँसको बिउ बितरण गर्ने ।क्
- रोगको सर्भिलेन्स तथा नियन्त्रण गर्ने ।
- पि.पि.आर. खोप ९९०० बारामा लगाउने ।
- २०० गाई,भैसी, बारामा कृत्रीम गर्भाभान सेवा पुर्याउने कार्य गर्ने ।

स्वागतम्

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक इकाई

प्रस्तुतकर्ता
मन्जु आचार्य
स.म.वि.नि.

ईकाई अन्तर्गत कार्यरत जनशक्ती संख्या :

२

स.म.वि.नि. – १

सामाजिक परिचालीका – १

सम्पादन भएका कार्यहरु :

- कार्यक्रमको आवश्यकता पहिचान तथा परिचयात्मक कार्यक्रम
- कार्यक्रमको आवश्यकता पहिचानको लागि सर्वेक्षण फारम वितरण गरि फारम भर्न लगाइएको
- सर्वेक्षण फारममा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका ब्यक्तीको लागि अपेक्षित कार्यक्रमको माग गरिएको साथै लैङ्गीक हिंसा र सीपमुलक तालिमको विषयमा सोधिएको ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरु विच अन्तरक्रीयात्मक कार्यक्रम तथा हववील चियर वितरण कार्यक्रम ।
- लैङ्गीक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत सचेतनामुलक र्याली कार्यक्रम र लैङ्गीक हिंसा सम्बन्धी सचेतनामुलक लोकगीत प्रतियोगिता ।
- गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका समुह ,सहकारी तथा संस्थाका सदस्यहरुलाई नेतृत्व तथा संस्थागत विकास तालिम ।
- अन्तराष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा अन्तर महिला समुह हाजिरिजवाफ प्रतियोगिता ।

महिलाको लागि अपेक्षित कार्यक्रम

- स्त्री प्रसुती रोग सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रम तथा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर
- सिपमुलक तथा आयमुलक तालिम सञ्चालन
- महिलाको हक हित र अधिकार सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन
- कृषी सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम

बालबालीकाको क्षमता बिकासको लागि अपेक्षीत कार्यक्रम :

- शारिरीक तथा मानसीक प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम गरिनु पर्ने
- प्रत्येक शिशु केन्द्र तथा विद्यालयहरुमा शैक्षिक सामाग्री वितरण गरिनु पर्ने ।
- बालबालिकाको लागि मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने ।

ज्येष्ठ नागरिकको लागि अपेक्षित कार्यक्रम :

१. निशुल्क स्वास्थ्य शिविर
२. ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र बितरण
३. ज्येष्ठ नागरिकको लागि भेटघाट स्थलको निर्माण गरिनु पर्ने ।

अपाङ्गता भएको व्यक्तीको लागि अपेक्षित कार्यक्रम :

१. आत्मनिर्भरता सम्बन्धी तालीम
२. अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण
३. सबै प्रकारका अपाङ्गलाई भत्ताको ब्यबस्था गर्ने ।
४. अपाङ्गता भएका ब्यक्तीको लागि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर
५. साहायक सामाग्री वितरण गरिनुपर्ने ।
६. अपाङ्गता भएको व्यक्ती को लागि सवारी साधनमा छुट हुनु पर्ने ।

२७ औं अन्तराष्ट्रीय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा लायन्स क्लब अफ पोखरा ग्रीनहील्स को सहयोगमा ५जना अपाङ्गता भएको व्यक्तीलाई हववीलचियर वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको





अवतारदित्र अपाङ्गुल दिवस
वर्षादेखेर हस्तगतका बाग्यार
संस्था, २०७३

Tree Chair Distribution Program
Lions Club of Pokhara Green Hill
Lions Club of Pokhara Green Hill
Lions Club of Pokhara Green Hill

देखेर
बाग्यार



हववील चियर पाउने व्यक्तीको विवरण

हववील चियर पाउने व्यक्तीको नाम	उमेर	लिङ्ग
१) डोलमाया भट्ट	२८ वर्ष	महिला
१) अम्बीका वाचे	६६ वर्ष	पुरुष
१) जिवन बगाले	७५ वर्ष	पुरुष
१) तेम बहादुर तामाङ	५९ वर्ष	पुरुष
१) अम्बीसरा आले	८३ वर्ष	महिला

लैङ्गीक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत सचेतनामलक र्याली कार्यक्रम





लैङ्गीक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत लोकगित प्रतियोगिता :



प्रतीयोगितामा सहभागी समुहहरु :

क्र.सं.	समुहको नाम	ठेगाना
१.	पशुपती महिला समुह	देवघाट,५ टाउनचोक
२.	कालिगण्डकी आमा समुह	देवघाट ,२
३.	गणेश सामुदायीक महिला समुह	देवघाट,५ पुलको मुख
४.	महेश सामुदायीक सन्यास आश्रम	देवघाट ५
५.	मिलन आमा समुह	देवघाट ३
६.	प्रगतिशिल आमा समुह	देवघाट ५
७.	शान्ती आमा समुह	देवघाट ५
८.	जनज्योती आमा समुह	देवघाट ५
९.	सिंचाड दुइघरे आमा समुह	देवघाट ४
१०.	छिमेकी आमा समुह	देवघाट १ कोटा



प्रमुख अतिथी माननिय सांसद शान्ता चौधरी बाट प्रथम पुरस्कार ग्रहण गर्दै सिञ्च्याङ्ग दुइघरे

आमा समुह, देवघाट ४ सिञ्च्याङ्ग



विशिष्ट अतिथी माननिय सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ बाट द्धितीय पुरस्कार ग्रहण गर्दै





देवघाट गाउँपालिका
बाल संजाल भवन
देवघाट-५, तनहुँ

“हाम्रो देवघाट, समृद्ध देवघाट”
नेतृत्व तथा संस्थागत विकास तालीम
२०७३/१०/०६ देखि २०७३/१०/०८ सम्म
आयोजक:
देवघाट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
देवघाट, तनहुँ



नेतृत्व तथा संस्थागत विकास तालिमका सहभागिहरूको विवरण

क्र.सं.	सहभागी समुहको नाम	ठेगाना	सहभागी व्यक्तीको संख्या
१.	श्री कोटा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था	देवघाट १ कोटा	३ जना
२.	हरिहर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था	देवघाट ५	७ जना
३.	देवघाट वचत तथा ऋण सहकारी संस्था	देवघाट ५	३ जना
४.	चौतारी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था	देवघाट १ कोटा	२ जना
५.	प्रगतीशील उपभोक्ता सहकारी संस्था	देवघाट ३ छिपछिपे	५ जना
६.	सिन्चाडगढी सामाजिक कृषी सहकारी संस्था	देवघाट ४ सिन्चाड	४ जना

जम्मा सहभागी समुह : ६ वटा
जम्मा सहभागी : २४ जना

सहभागीहरुको प्रतिनिधीत्व गरि तालिमको अनुभव सम्बन्धमा आफ्ना भनाइहरु राख्दै एक सहभागी



सहभागीहरुलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र वितरण गरिदैं ।



“लैंगिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार: समृद्धिको आधार”
"Think Equal, Build Smart, Innovate for change"
8th MARCH INTERNATIONAL WOMEN'S DAY
१०८ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस
(8th March, 2019) को अवसरमा आयोजित
अन्तर महिला समूह
हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता
२४ फाल्गुण, २०७५
सहयोग: गाउँपालिका तनहुँ
गाउँपालिका महिला संजाल



हाजीरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागी समुहको विवरण

क्र.सं.	सहभागी समुहको नाम	ठेगाना
१.	प्रगतीशील महिला समुह	देवघाट ५
२.	पशुपती आमा समुह	देवघाट ५
३.	चक्रवती महिला उद्यमी समुह	देवघाट ५
४.	देवघाट आमा समुह	देवघाट ५
५.	दिदी बहिनी महिला समुह	देवघाट ५
६.	कालीका महिला समुह	देवघाट ४
७.	कल्याण महिला समुह	देवघाट ५
८.	मिलिजुलि आमा समुह	देवघाट ४

अन्तर महिला समुह हाजिरिजवाफ प्रतियोगितामा सहभागी भएका समुहहरु





क्र.सं.	नाम	पद	वर्ग
१
२
३
४
५

आगामी चौमासीकको लागि कार्यक्रमहरू

- बालकलव गठन सञ्चालन ज्येष्ठ नागरीकको सरोकारवाला विच अन्तरक्रीयात्मक कार्यक्रम
- र नियमन
- बालबालिका माथी हुने शारिरिक ,मानसीक दण्ड सजाय तथा यौनजन्य दुर्व्यबहार न्युनिकरण सम्बन्धी सचेतना मुलक कार्यक्रम
- लैङ्गीक हिंसा निवारणमा न्यायीक समितीको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम
- समुह सदस्यको अनुशिक्षण तालिम

कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा आइपरेका प्रमुख समस्या

- सहभागिता जुटाउन निकै मुश्कील परेको

समस्या समाधानको लागि सुझाव

सहभागिलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रोत्साहन
भत्ता दिइनु पर्ने

● धन्यवाद
